

東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業 鉄道高架化工事のお知らせ

《Ⅰ工区》

UR竹の塚第二団地前では、引き続き仮線工事の軌道・電気工事(昼夜間)を行い、8月初旬に上り緩行線、9月中旬に下り緩行線を順次東側へ移設(いずれも夜間)する予定です。また都営伊興町第2アパート付近では、7月下旬から下り急行線高架橋の基礎杭工事(昼間)と躯体工事(昼夜間)を行う予定です。

《Ⅱ工区》

線路西側では、引き続き下り急行線高架橋の基礎杭工事(昼間)を行います。またエミエルタワー付近で下り急行線高架橋の躯体工事(昼間)に着手します。7月下旬には跨線人道橋付近の下り急行線をやや東寄りに移設(夜間)する予定です。跨線人道橋では、7月中旬から西側スロープ付き階段付替え工事の準備工事(夜間主体)を行う予定です。

《Ⅲ工区》

竹ノ塚駅西側では、引き続き下り急行線高架橋の基礎杭工事(昼間)と躯体工事(昼夜間)を行います。線路内では、引き続き仮設地下道関係工事として鋼矢板圧入とホーム受替え工事(夜間)を行います。また竹ノ塚駅西口では、7月中旬まで既設西口階段解体工事(昼夜間)を行います。

《Ⅳ工区》

引上線付近では、7月初旬に下り緩行線を東側へ移設(夜間)する予定です。その後、現下り緩行線の撤去工事(昼夜間)を行い、8月から仮下り急行線路盤工事(鋼矢板打設(夜間)と擁壁部コア削孔(昼間))を行う予定です。また8月中旬から補助261号線交差部付近にある鉄道施設の解体工事(昼間)を行う予定です。

騒音・振動の抑制に努めるとともに、事故のないよう安全第一で、工事を進めてまいります。また、夜間作業の予定は事前にチラシ等で周知させていただきます。


工事工程予定表

平成26年6月24日
東武鉄道竹ノ塚工事事務所

別添資料

工事概要		7月	8月	9月	連絡先
I 工 区	①仮線工事	上り緩行線軌道・電気工(昼夜間)～線路移設(8月初旬(夜間))		下り急行線軌道・電気工(昼夜間)	東急・東武JV TEL 03-3858-3501
	②高架橋工事	(基礎杭工)	基礎杭工(昼間)	下り緩行線軌道・電気工(昼夜間)～線路移設(9月中旬(夜間))	
		(躯体工)	山留工・掘削工・地中梁工・柱構築工(昼夜間)		
II 工 区	③高架橋工事(基礎杭工)	基礎杭工(昼間)			大成・東武JV TEL 03-5838-1033
	④高架橋工事(躯体工)	山留工・掘削工・地中梁工・柱構築工・上部工(昼間)			
	⑤仮線工事	下り急行線軌道・電気工(昼夜間)～線路移設(7月下旬(夜間))～撤去工(昼夜間)			
	⑥跨線人道橋改修工事	準備工事(夜間主体)		階段架設工(夜間主体)	
III 工 区	⑦高架橋工事(基礎杭工)	基礎杭工(昼間)			鹿島・東武谷内田 ・熊谷・東鉄JV TEL 03-5809-5450
	⑧高架橋工事(躯体工)	山留工・掘削工・地中梁工・柱構築工・上部工(昼夜間)			
	⑨仮設地下道関係工事	鋼矢板圧入、ホーム受替え工(夜間)			
	⑩駅施設解体工事	既設西口階段解体工(昼夜間)			
IV 工 区	⑪仮線工事	下り緩行線線路移設(7月初旬(夜間))～撤去工(昼夜間)			大林・東武・鉄建 ・戸田JV TEL 03-5647-8657
	⑫仮下り急行線路盤工事		鋼矢板打設工、掘削・残土搬出(夜間)	擁壁コア削孔(昼間)	
	⑬鉄道施設解体工事		建物解体工(昼間)		

全体平面図

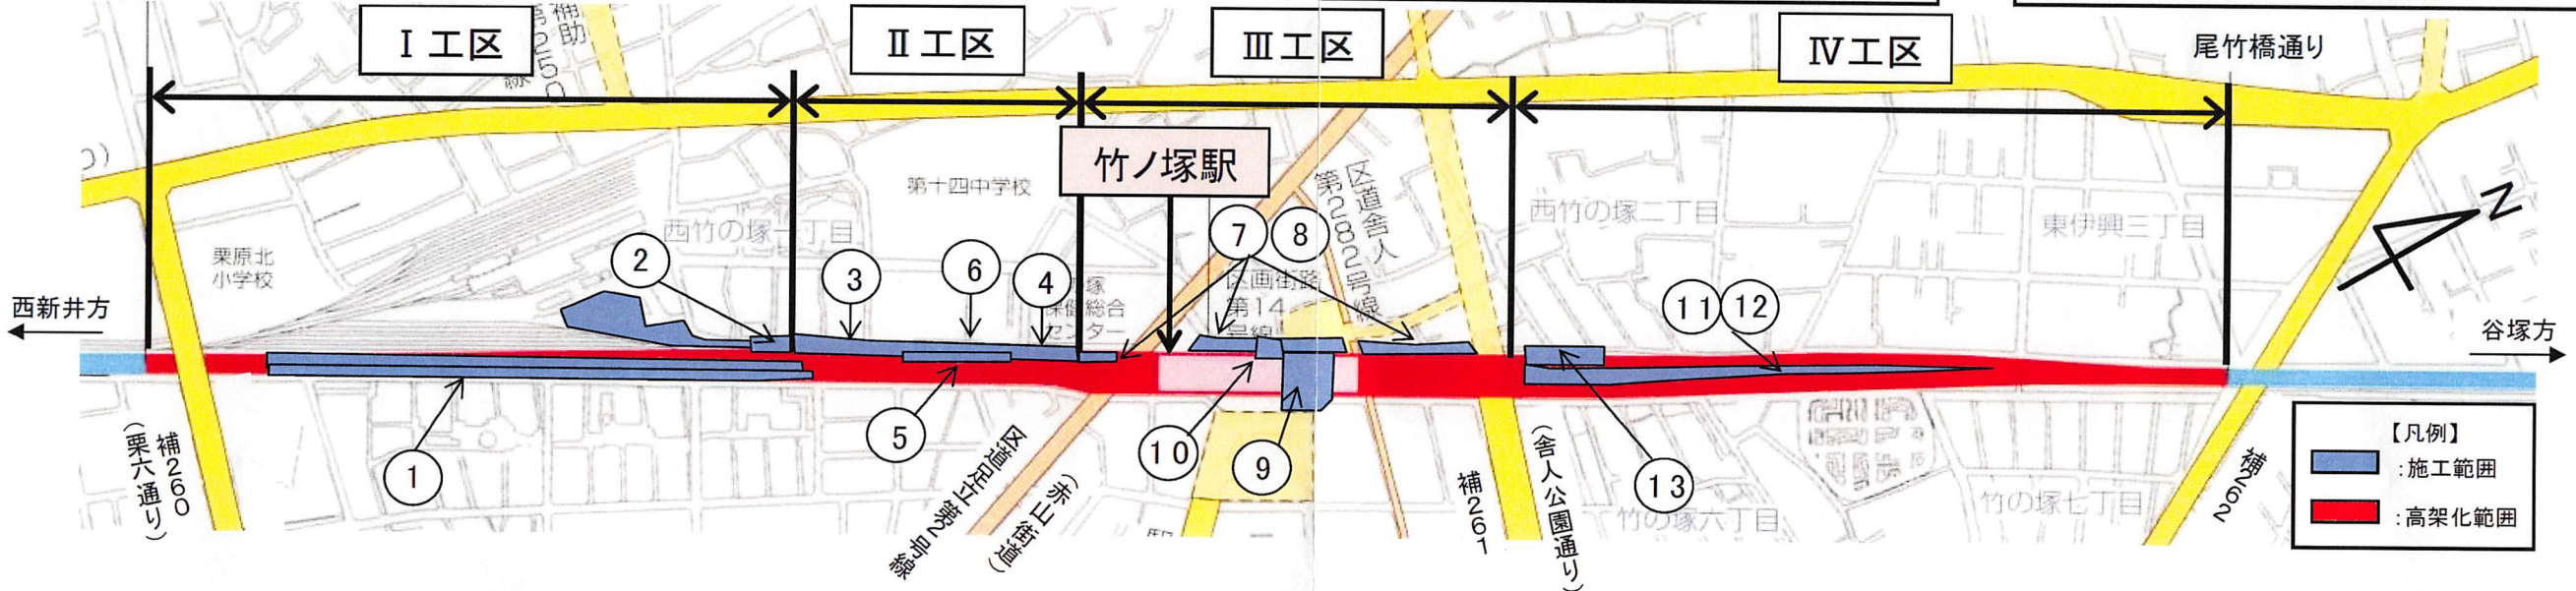

⑨仮設地下道関係工事状況



⑪仮線工事状況

※本資料についてご不明な点は、東武鉄道竹ノ塚工事事務所(TEL03-6807-1461)にお問い合わせ下さい。また、各工区の詳細は各工区の連絡先までお問い合わせ願います。
